



COMPTE RENDU N°12
Renouvellement de la canalisation d'eau potable
Ville Haute

COMPTE-RENDU
RÉUNION DU MARDI 19/05/2026 à 14H15
Lieu : Ville Haute

Toutes erreurs, modifications éventuelles, transmissions ou validations de documents demandés, devront parvenir par écrit dans les 8 jours au plus tard à compter de la date de transmission du présent compte-rendu.

A défaut, le présent compte-rendu sera entériné dans tous ses termes.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS :

REUNION MARDI 26/05/2026 A 14H15

FEUILLE DE PRÉSENCE

| Entité | Représentants | Email | Téléphone | Présents | Absents | Excusés | Convoqués | Invités | Diffusion |
|---------------------------------------|--|--------------------------------|----------------|----------|---------|---------|-----------|---------|-----------|
| Mairie de Névache | Monsieur Le Maire Alain BURGEVIN | maire@nevache.fr | 04 92 21 19 19 | X | | | | | X |
| | 1^{er} adjoint Jérôme SPAGGIARI | adjoint1@nevache.fr | 04 92 21 19 19 | X | | | | | X |
| | Secrétariat | secretariat.general@nevache.fr | 04 92 21 19 19 | | | | | | X |
| | Services Techniques Henry-Pierre ROUX | henry.pierre.roux@gmail.com | 06 07 23 80 27 | X | | | X | | X |
| | Services Techniques Jérôme STAGNARO | services.techniques@nevache.fr | 06 68 35 31 34 | X | | | X | | X |
| SPL Eau Services Haute Durance | Directrice Générale Julie SAHUC | direction@eaushd.fr | 04 92 20 57 57 | | | | | | X |
| | Responsable de projets Swann PAIN | etudes@eaushd.fr | 06 32 53 68 23 | X | | | X | | X |
| | Responsable d'exploitation Fabien MAUREL | etudes@eaushd.fr | 07 88 09 44 13 | X | | | X | | X |
| ALLAMANNO | Conducteur de travaux Fabien DROUMAGET | droumaguet.fabien@allamanno.fr | | X | | | X | | X |
| | Chef de chantier Freddie BOUILLET | bouillet.freddie@allamanno.fr | 07 82 70 81 42 | X | | | X | | X |

1- Compte rendu de la réunion

Point de situation au 19/05/2026 :


L'équipe de chantier est à ce jour dans le virage avant de rejoindre la Place de l'Église.



Ci-dessous l'état actuel de la canalisation renouvelée au 19/05/2026.



Pour la suite des travaux, 3 branchements sont à renouveler et ramener dans un regard (le BRIN SAUVAGE et la BOULANGERIE). Un paragel sera positionné en limite de propriété pour chacun des branchements.

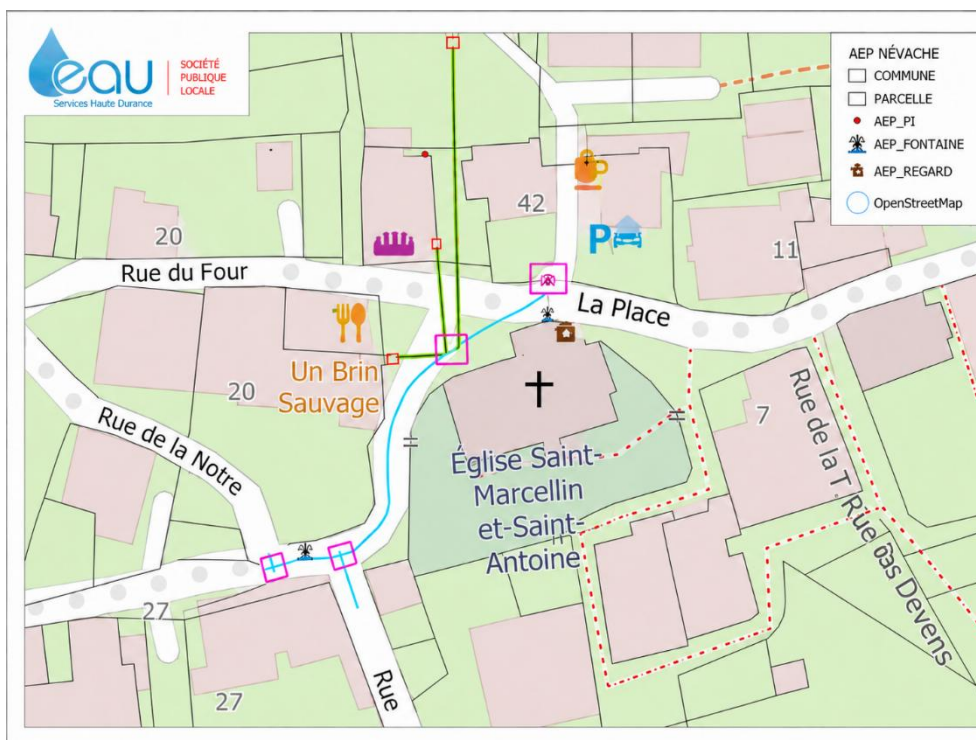

Les branchements renouvelés seront raccordés au dernier moment, une fois la canalisation principale raccordée des deux côtés. Au niveau du Paragel, un trou sera laissé ouvert pour permettre le raccordement une fois la nouvelle canalisation en eau.

- ⚠ Le branchement [REDACTED] serait piqué sur l'antenne de la boulangerie. Avant de basculer sur la nouvelle canalisation et abandonner l'ancienne, il faudra réaliser un provisoire en attendant de réaliser le branchement neuf côté Rue de Noré.
- ⚠ Si les travaux prévus ce printemps sont terminés avant le 1er Juillet, l'entreprise poursuivra la pose de la conduite dans le Chemin de l'Outre (ATTENTION à la communication le cas échéant).



Au niveau des poteaux incendie, le poteau n°4 Rue de Noré est supprimé ainsi que le poteau n°5 au Passage de là-bas devant. Le poteau incendie n°7 sera déplacé en rive gauche au niveau du pont sur le côté pour bien laisser un accès pour décharger la neige en hiver.

Reprise des travaux le 01/09/2026 :

Il a été décidé, afin de ne pas devoir creuser 2 fois l'entrée de chaque antenne (une fois pour pouvoir alimenter provisoirement ces dernières lors du renouvellement de la canalisation principale, une fois lors de la réalisation de l'antenne), de réaliser l'antenne de Noré en Septembre puis l'antenne de l'Outre et du Passage de là-bas devant. Ainsi, le réseau sera totalement renouvelé jusqu'à la Rue de Noré.

Bien veiller à s'organiser au niveau voirie car le temps de la réalisation de l'antenne, cette dernière sera fermée à la circulation.

Une fontaine tournante est située à l'entrée de la Rue de Noré, la mairie doit faire le point pour si cette dernière est conservée ou non.

**MAIRIE/ALLA
MANNO/SPL**

MAIRIE
