



COMPTE RENDU N°21

Renouvellement de la canalisation d'eau potable

Ville Haute

COMPTE-RENDU

RÉUNION DU MARDI 29/09/2026 à 14H15

Lieu : Services techniques Ville Haute

Toutes erreurs, modifications éventuelles, transmissions ou validations de documents demandés, devront parvenir par écrit dans les 8 jours au plus tard à compter de la date de transmission du présent compte-rendu.

A défaut, le présent compte-rendu sera entériné dans tous ses termes.


PROCHAIN RENDEZ-VOUS :

MARDI 06/10/26 A 14H15

1- Compte rendu de la réunion

Point de situation au 29/09/2026 :

ANTENNE RUE DE NORÉ = FINIE

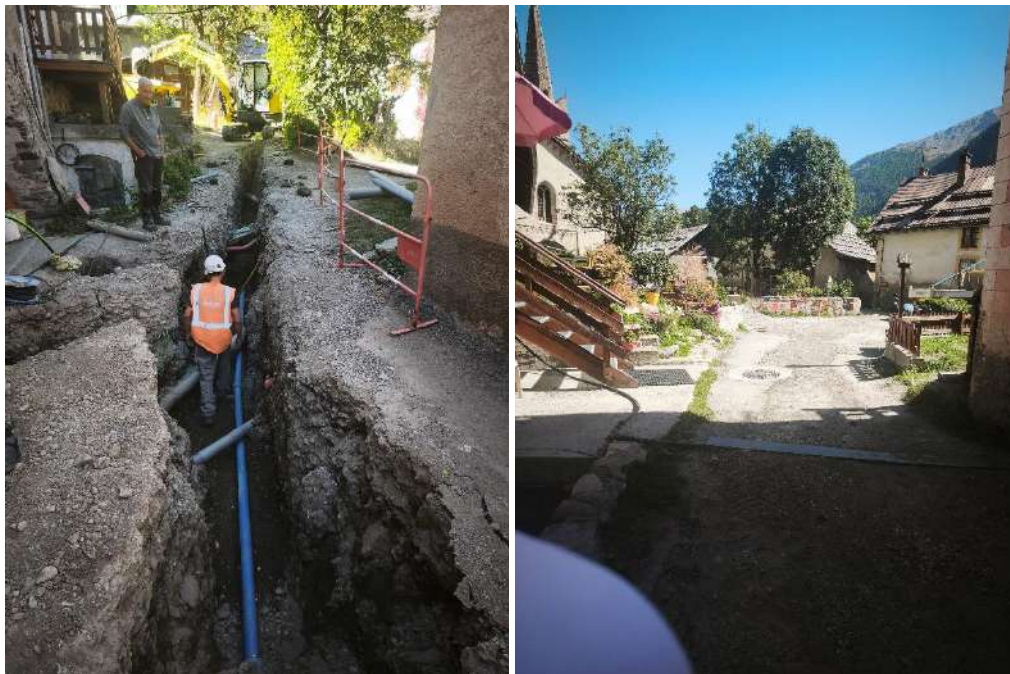

RACCORDEMENT PLACE DE L'EGLISE = FINI

La canalisation principale est actuellement posée Rue de la Cime de Ville à partir du regard de vannage de la Rue de Noré.



ANTENNE RUE DE L'OUTRE

La pose de la canalisation Rue de l'Outre est en cours.



Les deux premiers paragel ont été posés.



La fermeture en route barrée est prévue à partir du 12 Octobre pour 2 semaines.

Le pont de l'Outre est dégradé avant le passage des engins pour réaliser les travaux en rive droite :



--

