



COMPTE RENDU N°6

Renouvellement de la canalisation d'eau potable

Ville Haute

COMPTE-RENDU

RÉUNION DU MARDI 21/10/2025 à 14H00

Lieu : Ville Haute

Toutes erreurs, modifications éventuelles, transmissions ou validations de documents demandés, devront parvenir par écrit dans les 8 jours au plus tard à compter de la date de transmission du présent compte-rendu.

A défaut, le présent compte-rendu sera entériné dans tous ses termes.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS :

MARDI 28 OCTOBRE 2025 A 14H

1- Compte rendu de la réunion de chantier

Point de situation au 21/10/2025

- ✓ Mise en eau de la canalisation principale :

Le test sous pression a été réalisé. La canalisation a été désinfectée.

Lors de la réunion, la vanne du regard Place de l'Eglise a été ouverte pour alimenter la canalisation restante de ville haute par la nouvelle canalisation et non plus la sauterelle. Les maisons situées en haut qui avaient des problèmes de pression ont bien de nouveau une pression normale.



Figure 1 : Raccordement au niveau du Chemin de la Scie

Le branchement neuf de [REDACTED] Impasse des Antonins est en cours.

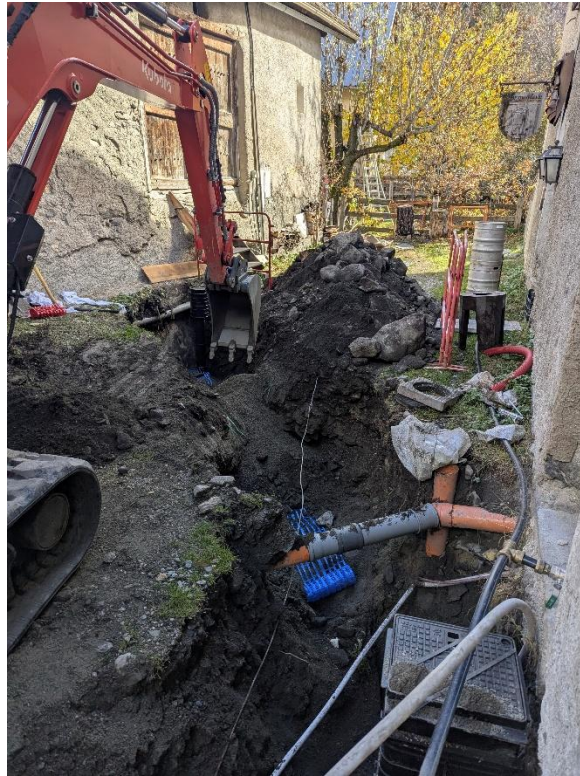


Figure 2 : Branchement neuf MME CLATOT

Le branchement plomb en partie privative du 110 Rue du Pied de ville a été renouvelé. L'entreprise ALLAMANNO effectue donc la pose du Paragel et va pouvoir remblayer le branchement en attente.



Figure 3 : Branchement renouvelé et passage de mur du n°110 Rue du pied de ville

Il reste le raccordement intérieur au niveau du 11 La Place.

Le raccordement du cimetière sera réalisé dans la même fouille que celle du poteau incendie de la mairie qui sera basculé côté église en lieu et place du bachas actuel.

A venir :

1. Raccorder les branchements définitivement sur la nouvelle canalisation en eau et retirer la sauterelle.
2. Réaliser le poteau incendie de l'église ainsi que le branchement du cimetière. Ainsi, tout le temps des prochains travaux, le poteau incendie de l'église sera désormais en eau sur une canalisation en DN 100 mm.
3. Réaliser l'antenne du Chemin de la Scie : l'entreprise va commencer par la fin du chemin (côté Clarée). Ainsi, suivant le temps des jours à venir, les 3 branchements actuels du Chemin de la Scie ont été raccordés pour être alimentés via la nouvelle canalisation.



Figure 4 : Départ du Chemin de la Scie et raccordement des 3 branchements actuels

Ainsi, peu importe le temps, tous les habitants sont de nouveau raccordés normalement pour l'hiver.
