



COMPTE RENDU N°4
Renouvellement de la canalisation d'eau potable
Ville Haute

COMPTE-RENDU
RÉUNION DE PRÉPARATION DU VENDREDI 07/10/2025 à 14H00
Lieu : Place de l'Eglise Ville Haute

Toutes erreurs, modifications éventuelles, transmissions ou validations de documents demandés, devront parvenir par écrit dans les 8 jours au plus tard à compter de la date de transmission du présent compte-rendu.

A défaut, le présent compte-rendu sera entériné dans tous ses termes.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS :

MARDI 14 OCTOBRE 2025 A 14H

1- Compte rendu de la réunion de chantier

Point de situation au 07/10/2025

A ce jour, la canalisation principale a été avancée depuis le regard Place de l'Eglise jusqu'à l'intersection avec l'Impasse des Antonins.



Regard Place de l'Eglise : mise en place d'une vanne de sectionnement (la conduite sera renouvelée jusqu'à cette vanne pour l'automne 2025), de deux piquages (un pour [REDACTED] et un second en attente).




Raccordement du regard Place de l'Eglise en direction du parking de Ville Haute, piquage pour le branchement 14 : 22 La Place Le Vialaou.



Branchement 14 renouvelé avec mise en place d'un paragel simple : 22 La Place Le Vialaou.



Branchement 12 : 11 La Place, mise en place d'un paragel double car les propriétaires séparent les 2 logements de la maison avec 2 arrivées d'eau distinctes.





Branchement 11 : 8 La Place, renouvellement du branchement et mise en place du paragel effectués.



Branchement 9 : 110 Rue du pied de ville, renouvellement du branchement, la parage sera mis une fois le remblai effectué car pour le moment la localisation du parage est sur la fouille mais un accès piéton est laissé.



La mise en place de la canalisation est au niveau de l'Impasse des Antonins.



Branchement 8 : 10 Impasse des Antonins : le branchement de la brasserie est un matériau étranger. Par conséquent, nous n'avons pas de raccord pour ce matériau-là. Une vanne a été localisée au droit de l'entrée de la maison. Il a été convenu de creuser jusqu'à cette dernière pour y raccorder le plymouth neuf. Il restera la mise en place du Paragel.

Un devis va être réalisé par Allamanno pour Mm [REDACTED] pour un branchement neuf côté Impasse des Antonins avec mise en place d'un paragel simple juste devant les escaliers.


ALLAMANO

Un point sur les poteaux incendie définitif est à fournir par la mairie (suppression, déplacement, création) dans l'enceinte des travaux. Attention bien prendre en compte que le poteau incendie doit être raccordé sur la fonte en DN 100 mm minimum.

MAIRIE

Une réserve a été émise sur un possible endommagement du réseau pluvial juste devant Cœur Clarée au moment du remblai (godet déchargé d'un coup). Voir avec Freddie s'il y a eu vérification par la suite.

ALLAMANNO

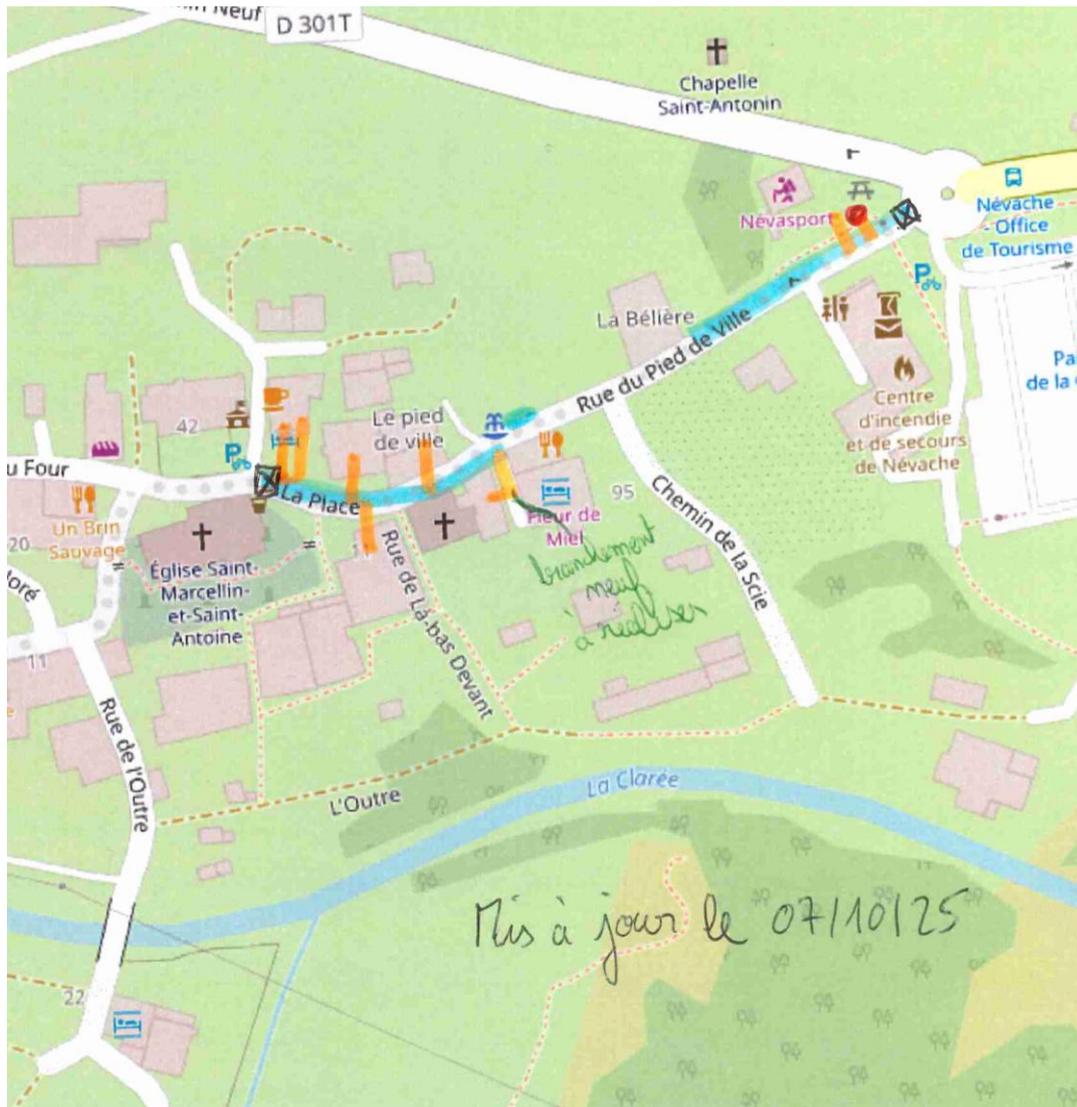

Avancement des travaux : en bleu la canalisation principale, en orange les branchements renouvelés.
